


**K** Koperskeuzelijst  
"Switi" te Amsterdam  
23 woningen  
Fase 2C  
d.d. 23-05-2017

**THUIS**  **BOUWEN** 

DE CREATIEVE, INSPIRENDENDE VILLABOUWERS

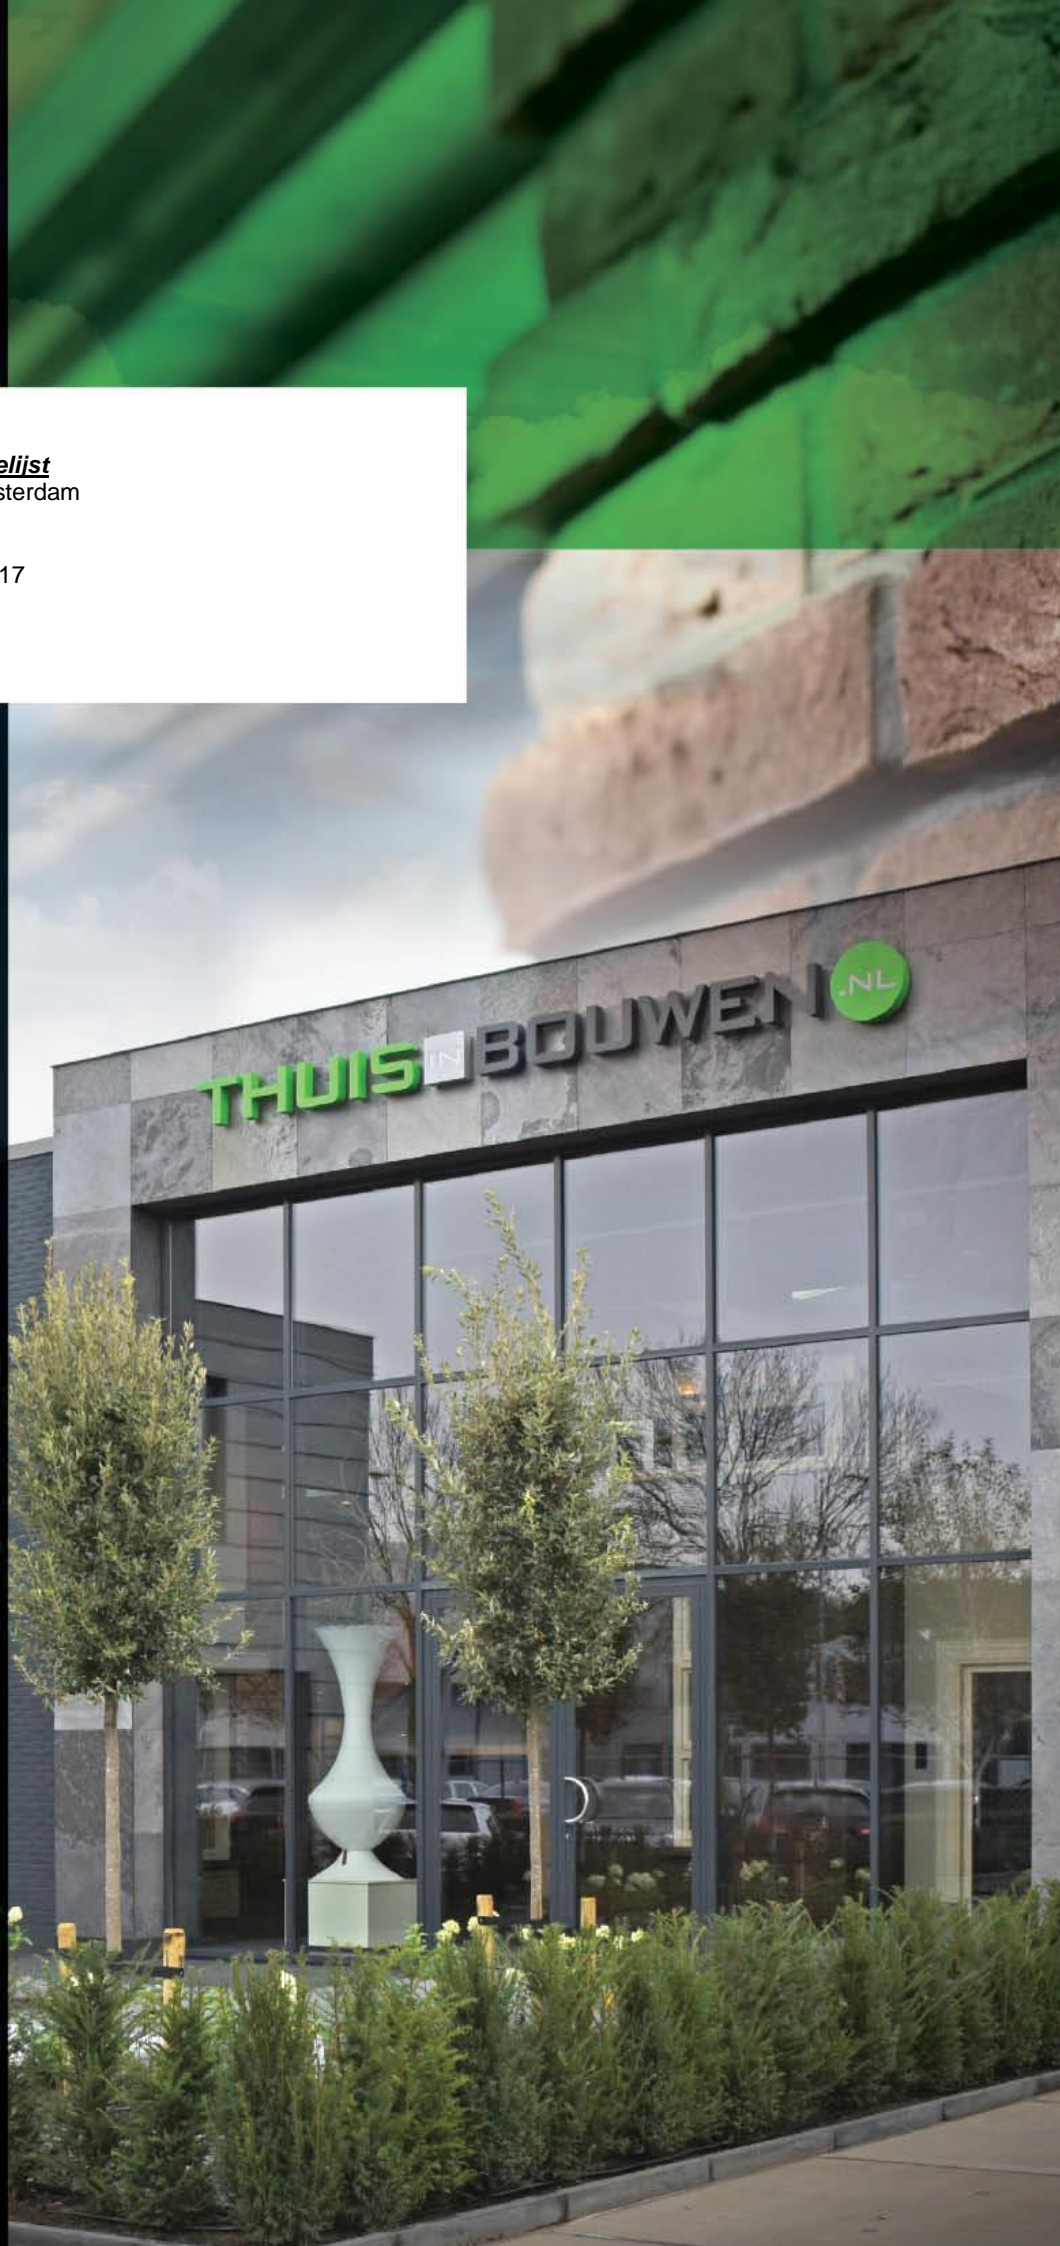

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
------	--------	---------	--------------	-------------------

**OMSCHRIJVING BOUWVERSLAG:**

00.00

**RUWBOUW/AFBOUW/ELECTRA/KEUKEN/SANITAIR BOUWNR.**

.....

Het vastleggen van uw wensen doen we met dit document.

U wordt door ons uitgenodigd om samen met onze kopersbegeleider uw wensen te bespreken en vast te leggen.

Bereid u zich goed voor op dit gesprek.

Deze optielijst geeft u alvast duidelijkheid over de verschillende opties die u kunt kiezen.

Uw wensen kunt u mogelijk alvast omcirkelen en aantekenen op de bijgevoegde tekening.

Gezamenlijk zullen we met u deze koperskeuzelijst in onze showroom bespreken.

00.01

**SLUITINGSDATA:**

\* Over de sluitingsdata van de verschillende onderdelen zullen wij u informeren.

\* Hierbij is het vooral van belang dat de definitieve aansluitpunten van de keuken, het sanitair en elektra bij ons bekend zijn.

- D.w.z. de exacte plaats van de ontvangst-toestellen.

- E.e.a. in verband met het op de juiste plaats aanbrengen van de rioleringen, water- en elektraleidingen in de begane grond- en de verdiepingsvloeren als ook de leidingwerken in de kruipruimte onder de begane grondvloer.

- Hiervoor moeten gemaatvoerde keuken- en sanitair tekening(en) worden verstrekt.

> Aan de hand van de installatie tekening(en) wordt dan bepaald waar de rioleringen, water-, elektraleidingen, lichtpunten en overige aansluitpunten in het werk worden aangebracht.

> In verband met de toegepaste vloertype (betonnen systeemvloeren) met de daarbij behorende beperkingen, in uw woning, kunnen de aansluitpunten op een andere plaats moeten worden aangebracht.

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
20			<b>HEIWERK</b>	
20.110	1,00	stuks	<b>Extra heipaal t.b.v. onderheid terras / uitbreiding</b>	475,00
22.			<b>RUWBOUW &amp; UITBREIDINGEN</b>	
22.112	1,00	post	<b>Uitgebouwde woonkamer afmetingen 1,20 m</b> - Afmeting aanbouw woning breedte x 1,20 m diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Verplaatsen radiator - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie d.m.v. 1 dubbele wandcontactdoos. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	11.500,00
22.113	1,00	post	<b>Uitgebouwde woonkamer afmetingen 2,40 m</b> - Afmeting aanbouw woning breedte x 2,40 m diepte. - Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien van bitumineuze dakbedekking. - Plafond met wit spuitwerk afwerking. - Gevels als spouwmuur. - Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst. - Verplaatsen radiator - Uitbreiding voorzien van elektrische installatie d.m.v. 2 dubbele wandcontactdozen. - Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.	19.500,00
22.117	1,00	post	<b>Onderheid terras afmetingen 2,40 m</b> - Afmeting terras woning breedte x 2,40m diepte. - Hoogte bovenzijde ruwe onafgewerkte betonvloer 150mm -Peil.	5.350,00
22.118	1,00	post	<b>Trapkast onder 1e verdiepingstrap</b> - Plaatsen van een separatiwand en deze voorzien van een binnendeurkozijn met bovenlicht met dicht paneel en binnendeur. - In de trapkast word een wandlichtpunt met schakelaar aangebracht.	1.700,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
22.219	1,00	post	<p><b>Zolder indeling met twee kamers (onbenoemde ruimten):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De indeling van de tweede verdieping volgens optie tekening.</li> <li>&gt; Twee zolderkamers (onbenoemde ruimten).</li> <li>&gt; In elke zolderkamer 2 dubbele wandcontactdoor met een lichtpunt</li> <li>&gt; In elke kamer een radiator aanbrengen.</li> <li>&gt; De cv en mv in een kast plaatsen, bereikbaar vanaf de zolder overloop</li> <li>&gt; De cv en mv kast voorzien van een lichtpunt.</li> <li>&gt; De aftimmeringen worden niet geschilderd.</li> </ul> <p>De zolderindeling is benoemd als onbenoemde ruimte. Dit betekent als dat de zolderkamers gebruikt gaan worden als verblijfsgebied (bv slaapkamers) deze voldoen niet conform het bouwbesluit. Hierdoor wijzigen de technische en bouwfysische eisen, zoals ventilatie en geluidisolatie.</p> <p>Optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 24.110 en 24.111.</p>	5.900,00
24			<b>RUWBOUWTIMMERWERK</b>	
24.110	1,00	post	<p><b>Vlieringvloer aanbrengen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vuren houten balklaag voorzien van 18mm underlayment.</li> <li>- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.</li> </ul>	2.000,00
24.111	1,00	post	<p><b>Gipsplafond vlieringvloer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gipsplaten plafond, incl. plafondplinten voorzien van spuitwerk.</li> <li>- Gipsplaten met ronde kanten.</li> <li>- Exclusief schilderwerk.</li> <li>&gt; Combinatie optie met 24.110. Vlieringvloer</li> </ul>	1.500,00
24.112	1,00	post	<p><b>Vlizotrap in vlieringvloer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leveren en monteren van 3-deling vuren vlizotrap 70x120cm, incl. aftimmering boven- en onderzijde</li> <li>- Exclusief schilderwerk.</li> <li>&gt; Combinatie optie met 24.110. Vlieringvloer aanbrengen en 24.111. Gipsplafond vlieringvloer.</li> </ul>	700,00
24.220	1,00	post	<p><b>Woning voorzien van 2-lids dakkapel voorgevel 2e verdieping: afm 1900 x 1700 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaats en exacte uitvoering (afmeting) wordt bepaald in overleg met gemeente, aannemer en architect.</li> <li>- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draairaam.</li> <li>- Afmeting dakkapel ± 1900mm breed x 1700mm hoog. (buitenwerks)</li> <li>- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.</li> <li>- Exclusief binnen schilderwerk.</li> </ul> <p><b>Deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 68-82-89-90-97</b></p>	5.500,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
24.221	1,00	post	<b>Woning voorzien van 2-lids dakkapel achtergevel 2e verdieping: afm 1900 x 1700 mm</b> - Plaats en exacte uitvoering (afmeting) wordt bepaald in overleg met gemeente, aannemer en architect. - Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draairaam. - Afmeting dakkapel ± 1900mm breed x 1700mm hoog. (buitenwerks) - Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk. - Exclusief binnen schilderwerk. <b>Deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 68-82-89-90-97</b>	5.500,00
24.222	1,00	post	<b>Woning voorzien dichtgezette dakkapel sparing voorgevel 2e verdieping: afm 1900 x 1700 mm, tbv toekomstige dakkapel.</b> - Plaats en exacte uitvoering (afmeting) wordt bepaald in overleg met gemeente, aannemer en architect. - Dakkapelsparing op plaats volgens optietekening. - Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.	1.200,00
24.223	1,00	post	<b>Woning voorzien dichtgezette dakkapel sparing achtergevel 2e verdieping: afm 1900 x 1700 mm, tbv toekomstige dakkapel.</b> - Plaats en exacte uitvoering (afmeting) wordt bepaald in overleg met gemeente, aannemer en architect. - Dakkapelsparing op plaats volgens optietekening. - Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.	1.200,00
33			<b>DAKBEDEKKING</b>	
33.200a	1,00	post	<b>Velux dakraam voorgevel GGL-SK06 afmeting 1140x1180mm</b> - Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-SK06 3059 HR++ glas afmeting 1140x1180mm. - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd) - Als aftimmering rondom het dakraam een koplát aanbrengen op de dakplaat. - Exclusief schilderwerk. - Positie volgens optietekening.	1.375,00
33.200b	1,00	post	<b>Velux dakraam achtergevel GGL-SK06 afmeting 1140x1180mm</b> - Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-SK06 3059 HR++ glas afmeting 1140x1180mm. - Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd) - Als aftimmering rondom het dakraam een koplát aanbrengen op de dakplaat. - Exclusief schilderwerk. - Positie volgens optietekening.	1.375,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
30			<b>KOZIJNEN. RAMEN EN DEUREN</b>	
30.101	1,00	post	<b>Openslaande dubbele deuren in de voorgevel keuken</b> - De alternatieve voorgevelindeling. - Voorgevelkozijn volgens basis gevelindeling komt te vervallen.	1.575,00
30.103	1,00	post	<b>Openslaande tuindeuren met zijlichten in de achtergevel woonkamer</b> - De alternatieve achtergevelindeling. - Achtergevelkozijnen volgens basis gevelindeling komen te vervallen.	3.350,00
30.150	1,00	stuks	<b>Inzethor ten behoeve van draaikiepraam</b> - Aluminium frame en fabrieksmatig voorzien van horrengaas. (frame gebroken wit)	105,00
30.201	1,00	stuks	<b>Binnendeurkozijn staal uitgevoerd met dicht paneel ipv helder glas in bovenlicht</b>	50,00
30.210	1,00	stuks	<b>Luxe binnendeur i.p.v. standaard opdek. STELPOST €275,00</b> - Aankoop luxe binnendeur stelpost € 275,- excl. BTW - Na keuze deurtype zal deze stelpost worden verrekend - Inclusief schilderwerk deur in één kleur (gebroken wit) - fabrikaat LivingDoors	675,00
40			<b>STUKADOORWERK</b>	
40.100	1,00	post	<b>Binnenwanden begane grond sausklaar afwerken</b> - Tot en met onderzijde 1e verdiepingsvloer. - Exclusief sauswerk. > m.u.v. toilet, meterkast	1.500,00
40.120	1,00	post	<b>Binnenwanden eerste verdieping sausklaar afwerken</b> - Tot en met onderzijde 2e verdiepingsvloer. - Exclusief sauswerk. > m.u.v. badkamer	2.400,00
41			<b>TEGELWERKEN</b>	

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
------	--------	---------	--------------	-------------------

41.100

**Tegelwerk door tegel-showroom**

- Voor het maken van uw keuze, zal met u een afspraak worden gemaakt door de tegel-showroom:

Lingen Keramiek  
Rooseveltstraat 6  
2321 BM Leiden  
Tel: 071-5794355

De sluitingsdatum is d.d. ....

- U neemt het complete tegelwerk af bij de aangewezen tegel-showroom.

- De tegel-showroom zorgt voor de offerte, levering en montage.
- Wijzigingen en uitbreidingen van het tegelwerk zijn mogelijk, mits tijdig aangegeven. Verrekening volgt.
- Het standaard tegelwerk wordt in de offerte van de tegel-showroom verrekend.
- Koper draagt er zorg voor dat, voor de sluitingsdatum, de tekeningen van de tegel-showroom aan de aannemer wordt verstrekt.
- > Bouwkundige wijzigingen n.a.v. de tegeltekeningen, worden verwerkt in de offerte van de tegel-showroom.
- Tegel- en bouwkundige wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum afbouwalternatieven bij de aannemer bekend zijn, kunnen helaas niet meer verwerkt worden.

41.101

**Tegelwerk overige vloeren**

- Bij de tegel-showroom is het ook mogelijk om bijv. een offerte te laten maken voor tegelwerk van de begane grond vloeren.

- De tegel-showroom zorgt voor de offerte, levering en montage.
- Wijzigingen en uitbreidingen van het tegelwerk zijn mogelijk, mits tijdig aangegeven. Verrekening volgt.
- Koper draagt er zorg voor dat, voor de sluitingsdatum, de tekeningen van de tegel-showroom aan de aannemer wordt verstrekt.
- > Bouwkundige wijzigingen n.a.v. de tegeltekeningen, worden verwerkt in de offerte van de tegel-showroom.
- Tegel- en bouwkundige wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum afbouwalternatieven bij de aannemer bekend zijn, kunnen helaas niet meer verwerkt worden.

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
47			<b>KEUKENINRICHTING</b>	
47.120	1,00	post	<p><b>Keuken plaatsen, vooroplevering, door de aangewezen keuken leverancier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor het maken van uw keuze, zult u uitgenodigd worden door onze partner:  KeukenVision Bunnik  Rumpsterweg 8b  3981 AK Bunnik  Tel: 030 - 870 03 34</li> <li>- Aansluitpunten worden aangepast volgens het keuken-installatieschema</li> <li>&gt; Verplaatsen en/of extra installatie aansluitpunten worden in de offerte van de keuken-leverancier verwerkt.</li> <li>- De keukenleverancier zorgt voor de offerte, levering, montage, oplevering en aansluitingen.</li>   <li>- Wanneer er gekozen wordt de keuken via een andere leverancier te kopen draagt de koper er zorg voor dat, voor de sluitingsdatum, de tekening van de keukenleverancier met een complete en gemaatvoerde keuken-installatietekening aan de aannemer wordt verstrekt.</li> <li>&gt; Installatie en of bouwkundige wijzigingen n.a.v. de keukentekeningen, worden verwerkt in het bouwverslag of een apart keuken-bouwverslag.</li> <li>- Wijzigingen en uitbreidingen van het installatiewerk van de keuken zijn mogelijk, mits tijdig aangegeven. Verrekening volgt.</li>   <li>- Installatie- en bouwkundige wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij de aannemer bekend zijn, kunnen helaas niet meer verwerkt worden.</li> </ul>	
47.130	1,00	post	<p><b>Keuken plaatsen, ná de oplevering, door uw eigen keukenleverancier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De koper zoekt keuken uit bij derden.</li> <li>- Alle aansluitpunten worden op de standaard posities afgedopt opgeleverd.</li> <li>&gt; Electra aansluitpunten zijn afgemonteerd.</li> <li>- Uw keukenleverancier zorgt voor de offerte, facturering en het eventueel verleggen van de leidingen.</li> <li>- Wijzigingen en uitbreidingen van het installatiewerk van de keuken zijn mogelijk, mits tijdig aangegeven. Verrekening volgt.</li> <li>- Koper draagt er zorg voor dat, voor de sluitingsdatum, de tekening van de keukenleverancier met een complete en gemaatvoerde keuken-installatietekening aan de aannemer wordt verstrekt.</li> <li>&gt; Installatie en of bouwkundige wijzigingen n.a.v. de keukentekeningen, worden verwerkt in het bouwverslag of een apart keuken-bouwverslag.</li> <li>- Installatie- en bouwkundige wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij de aannemer bekend zijn, kunnen helaas niet meer verwerkt worden.</li> </ul>	-2.000,00



Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
51			<b>RIOLERING, WATER en GASINSTALLATIES</b>	
51.104	1,00	stuks	<b>Buitenkraan vorstvrij</b> - Koudwaterkraan met slangwartel en opbouw-gevelplaat. - Kraan met zelf hevelende en vorstvrije uitvoering. - excl. afvoerput.	395,00
53			<b>SANITAIR</b>	
53.100	1,00	post	<b>Badkamer en toilet casco uitvoeren</b> - Toilet begane grond en badkamer verdieping worden casco uitgevoerd - Dekvloer in de badkamer vervalt - Dekvloer in het toilet wordt aangebracht - Stucwerk wanden vervalt - Tegelwerk vervalt - Plafonds zullen wel standaard worden afgewerkt - Installatie zal afgedopt 5 cm voor de wand en uit de vloer worden opgeleverd - Elektra wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden  Bij deze keuze is de regeling 'LIMITERING GARANTIE' voor de vervallen onderdelen en de waterdichtheid van de badkamer vloer van toepassing. (zie 90.100 en 90.101)	-1.750,00
53.101	1,00	post	<b>Badkamer plaatsen, vooroplevering, door de aangewezen Sanitair-showroom:</b> - Voor het maken van uw keuze van het sanitair, kranen en accessoires, zal met u een afspraak gemaakt worden door sanitair showroom: Plieger B.V. Rooseveltstraat 6 2321 BM LEIDEN Tel: 071-535 17 00 De sluitingsdatum is d.d. .... - De sanitair-showroom zal al uw wensen en keuzen verwerken in een showroomrapport en badkamertekening(en). - Het sanitair wordt gespecificeerd per ruimte, waarbij tevens eventuele douchewanden, inbouwvoorzieningen en dergelijke moeten worden bepaald. - De verrekening van het sanitair met het standaard opgenomen sanitair + inbouwwerken, met de daarbij behorende verrekening arbeid, gebruiksmaterialen en organisatiekosten zal door de sanitair-showroom worden verzorgt. - Koper draagt er zorg voor dat, voor de sluitingsdatum, de tekeningen van de sanitair-showroom met een compleet en gemaatvoerde tekening aan de aannemer wordt verstrekt. - Installatie- en bouwkundige wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij de aannemer bekend zijn, kunnen helaas niet meer verwerkt worden.	

Datum: 23 mei 2017

Paraaf opdrachtgever:  
Datum:

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
60			<b>VERWARMINGSINSTALLATIES</b>	
60.100	1,00	stuks	<b>Klokthermostaat Chronotherm Vision i.p.v. standaard</b>	285,00
60.112	1,00	stuks	<b>Extra radiator op zolder</b> - Plaats op zolder door koper aan te geven	680,00
60.210a	1,00	post	<b>Vloerverwarming Hoofdverwarming i.p.v. radiatoren op de begane grond excl regeling (Geldt niet voor bouwnummer 82, 97)</b> - Radiatoren vervallen. - Verdeelunit van vloerverwarming in de hal. - T.b.v. de vloerverwarmingpomp wordt een enkelvoudige wcd gemonteerd. - Dekvloer voorzien van een enkel blank stalen krimpwapening-bouwstaalmaat onder de vloerverwarmingslangen. - Zandcement dekvloer wordt 20mm dikker aangebracht. - Bij toepassing van vloerverwarming dient de vloerbedekking hierop afgestemd te zijn. - U moet hierbij denken aan "harde" vloerbedekkingen zoals tegels, natuursteen, siergrindvloeren, parketvloeren & apijtvloerbedekking mits deze laatste 2 bedekkingen geschikt zijn voor vloerverwarming.  DEZE OPTIE IS ZONDER NAREGELING PER RUIMTE.	2.600,00
60.210b	1,00	post	<b>Vloerverwarming Hoofdverwarming i.p.v. radiatoren op de begane grond excl regeling Bouwnummer 82, 97</b> - Radiatoren vervallen. - Verdeelunit van vloerverwarming in de hal. - T.b.v. de vloerverwarmingpomp wordt een enkelvoudige wcd gemonteerd. - Dekvloer voorzien van een enkel blank stalen krimpwapening-bouwstaalmaat onder de vloerverwarmingslangen. - Zandcement dekvloer wordt 20mm dikker aangebracht. - Bij toepassing van vloerverwarming dient de vloerbedekking hierop afgestemd te zijn. - U moet hierbij denken aan "harde" vloerbedekkingen zoals tegels, natuursteen, siergrindvloeren, parketvloeren & tapijtvloerbedekking mits deze laatste 2 bedekkingen geschikt zijn voor vloerverwarming.  DEZE OPTIE IS ZONDER NAREGELING PER RUIMTE.	3.000,00

Datum: 23 mei 2017

Paraaf opdrachtgever:  
Datum:

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
60.215	1,00	post	<p><b>Vloerverwarming Hoofdverwarming icm uitbreiding 1200mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiatoren vervallen.</li> <li>- Verdeelunit van vloerverwarming in de hal.</li> <li>- T.b.v. de vloerverwarmingpomp wordt een enkelvoudige wcd gemonteerd.</li> <li>- Dekvloer voorzien van een enkel blank stalen krimpwapening-bouwstaal mat onder de vloerverwarmingslangen.</li> <li>- Zandcement dekvloer wordt 20mm dikker aangebracht.</li> <li>- Bij toepassing van vloerverwarming dient de vloerbedekking hierop afgestemd te zijn.</li> <li>- U moet hierbij denken aan "harde" vloerbedekkingen zoals tegels, natuursteen, siergrindvloeren, parketvloeren &amp; tapijtvloerbedekking mits deze laatste 2 bedekkingen geschikt zijn voor vloerverwarming.</li> </ul> <p>DEZE OPTIE IS ZONDER NAREGELING PER RUIMTE.</p>	450,00
60.216	1,00	post	<p><b>Vloerverwarming Hoofdverwarming icm uitbreiding 2400mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiatoren vervallen.</li> <li>- Verdeelunit van vloerverwarming in de hal.</li> <li>- T.b.v. de vloerverwarmingpomp wordt een enkelvoudige wcd gemonteerd.</li> <li>- Dekvloer voorzien van een enkel blank stalen krimpwapening-bouwstaal mat onder de vloerverwarmingslangen.</li> <li>- Zandcement dekvloer wordt 20mm dikker aangebracht.</li> <li>- Bij toepassing van vloerverwarming dient de vloerbedekking hierop afgestemd te zijn.</li> <li>- U moet hierbij denken aan "harde" vloerbedekkingen zoals tegels, natuursteen, siergrindvloeren, parketvloeren &amp; tapijtvloerbedekking mits deze laatste 2 bedekkingen geschikt zijn voor vloerverwarming.</li> </ul> <p>DEZE OPTIE IS ZONDER NAREGELING PER RUIMTE.</p>	
60.217	1,00	post	<p><b>Vloerverwarming Badkamer Hoofdverwarming i.p.v. radiator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiator vervalt</li> <li>- Vloerverwarming met RTL ventiel i.v.m. stadsverwarming</li> <li>- Temperatuur badkamer middel RTL Thermostaatknop in de wand</li> </ul>	700,00
60.218	1,00	post	<p><b>EVO Home systeem</b></p> <p>Regeling vloerverwarming begane grond en radiatoren verdieping</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controle over uw verwarmingsstelsel waar u ook bent</li> <li>- Centraal Evo Home bedienpaneel</li> <li>- Modulaire opbouw</li> <li>- Draadloos</li> <li>- Onderweg bedienbaar middels smartphone-app (Wifi aansluiting te verzorgen door opdrachtgever)</li> </ul>	2.750,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
70			<b>ELEKTRONISCHE INSTALLATIES</b>	
70.100			<b>WANDCONTACTDOZEN</b>	
70.101	1,00	stuks	<b>Extra dubbele wandcontactdoos (wcd)</b> - Montage in 1 ovalebouwdoos (vlak-montage) - Hoogte volgens omschrijving	220,00
70.102	1,00	stuks	<b>Extra enkele wandcontactdoos (wcd)</b> - Montage in 1 inbouwdoos (vlak-montage) - Hoogte volgens omschrijving	180,00
70.111	1,00	stuks	<b>Wandcontactdoos dubbel in de meterkast</b> - Montage opbouw.	85,00
70.114	1,00	stuks	<b>Combinatie wandcontactdoos enkel bij schakelaar</b> - Montage in 1 inbouwdoos naast schakelaar onder 1 afdekplaat (half-opbouw-montage) - Hoogte volgens omschrijving	95,00
70.200			<b>SCHAKELAARS</b>	
70.201	1,00	stuks	<b>Extra enkelpolige schakelaar</b> - Montage in 1 inbouwdoos (vlak-montage) - Schakelaar wordt geplaatst vlg. elektra-schema of omschrijving.	150,00
70.300			<b>LEIDINGEN</b>	
70.301	1,00	stuks	<b>Extra loze leiding</b> - Leiding eindigend in een ombouwdoos in de wand + trekdraad. - Plaats en hoogte volgens omschrijving.	140,00
70.302	1,00	stuks	<b>Loze leiding bedraden inclusief afmontage</b> CAI / Telefoon / UTP (doorhalen wat niet van toepassing is)  - Montage in 1 inbouwdoos. - Afmonteren met afmontageplaatje. - Plaats en hoogte volgens omschrijving.	120,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
70.400			<b>APARTE GROEPEN</b>	
70.402	1,00	stuks	<b>Leiding bedraden op aparte groep 230V</b> - Montage in 1 inbouwdoos (vlak-montage). - Hoogte volgens omschrijving. - Inclusief groep in de meterkast. - Exclusief evt. uitbreiding aardlekschakelaars in meterkast.	255,00
70.405	1,00	stuks	<b>Complete aparte groep t.b.v. de vaatwasser</b> - Montage in 1 inbouwdoos (vlak-montage). - Hoogte volgens omschrijving. - Inclusief groep in de meterkast. - Exclusief evt. uitbreiding aardlekschakelaars in meterkast.	360,00
70.406	1,00	stuks	<b>Complete aparte groep t.b.v. de wasdroger</b> - Montage in 1 inbouwdoos (vlak-montage). - Hoogte volgens omschrijving. - Inclusief groep in de meterkast. - Exclusief evt. uitbreiding aardlekschakelaars in meterkast.	360,00
70.409	1,00	stuks	<b>Extra aardlekschakelaar bij meer groepen dan 8, 12, enz.</b> - Indien de installatie wordt uitgebreid naar meer dan 8, 12 of 16 groepen, zijn wij verplicht een extra aardlekschakelaar bij te plaatsen.	360,00
70.700			<b>GRONDKABEL</b>	
70.704	1,00	post	<b>Grondkabel t.b.v. tuinverlichting 3x 2.5 mm<sup>2</sup>, 15m1</b> - Lengte berekenen vanuit de meterkast (niet op aparte groep) - Kabel wordt op rol tegen de gevel aangeleverd.	400,00
70.800			<b>AANSLUITPUNTEN</b>	
70.801	1,00	stuks	<b>Extra lichtpunt inclusief schakelaar</b> - Leiding eindigend met een centraaldoos + bedraad. - Schakelaar wordt geplaatst vlgs. elektra-schema of omschrijving. - Hoogte volgens omschrijving. - Plaats aangeven middels tekening.	415,00
70.802	1,00	stuks	<b>Aansluitpunt t.b.v. zonwering incl. schakelaar</b> - Leiding eindigend met een pijpje uit de gevel + bedraad. - Schakelaar wordt geplaatst vlgs. elektra-schema of omschrijving. - Hoogte volgens omschrijving. - Plaats aangeven middels tekening.	245,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
88.100	1,00	verd	<b>Aanpassen tekenwerk per verdieping</b> - Bijv. veranderen draairichting deur, extra wanden, aanpassen installaties, etc.	190,00
88.101	1,00	post	<b>Aanpassen verslag</b> - Enkel aanpassingen ten gevolge van wijzigingen door opdrachtgever.	190,00
90			<b>LIMITERING GARANTIE:</b>	
90.100	1,00		<b>Nieuw inspectiebeleid Nutsbedrijven:</b> Indien door de verkrijger, na oplevering van de woning, werkzaamheden aan de gas-, water- en elektrische installaties worden verricht, moeten deze voldoen aan de voorwaarden van de nutsbedrijven. De werkzaamheden moeten door de nutsbedrijven worden goedgekeurd, tenzij ze worden verricht door een zogenaamde 'Waarborg installateur'.  De mogelijkheid bestaat dat de nutsbedrijven (met name het waterleidingbedrijf) bepaalde voorwaarden stellen aan voorgenoemde werkzaamheden en/of extracontrole- c.q. keuringskosten in rekening brengen. De verkrijger dient één en ander zelf met bovengenoemde bedrijven af te stemmen en is hiervoor zelf verantwoordelijk. Eventuele extra kosten komen voor rekening van de verkrijger.	
90.101	2,00		<b>Limitering Woningborg garantie en vrijwaring:</b> Werkzaamheden, materialen en constructies die niet door of onder de verantwoordelijkheid van de aannemer zijn verricht/toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan (in)direct het gevolg zijn, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verkrijger.  De verkrijger vrijwaart hiermee de aannemer voor mogelijke aanspraken van derden en zijn de artikelen 15 en 16 van de Algemene Voorwaarden bij de koop-/aannemingsovereenkomst niet van toepassing. Tevens wordt er geen Woningborg-garantie verstrekt.	

Project: 23 woningen "Switi Fase 2C" te Amsterdam

Projectnummer: U17040

Bouwnummer: .....

Naam: .....

Gedaan te ..... d.d. ....2017

Handtekening:

.....

Datum: 23 mei 2017

Paraaf opdrachtgever:  
Datum:

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
------	--------	---------	--------------	-------------------

**TOTAALBEDRAG €**

**Voor akkoord:**

Naam opdrachtgever:

.....

Handtekening:

.....

Datum:

.....

Samen hebben we deze afspraken gemaakt. Deze zijn exclusief van toepassing op onze onderling gesloten overeenkomst. Anderen kunnen hieraan geen rechten ontleen of aanspraak op doen.

Datum: 23 mei 2017

Paraaf opdrachtgever:  
Datum:
